



项目财务流程

Project Financial Process Training

编制：洪鑫浩 | 2026年5月11日

一 团队介绍

二 版本介绍及主要输出点

三 预算相关

四 Ariba & 成本卡相关


五 其它 - 审核及反馈

六 出差申请报销



0514 培训签到表

扫一扫二维码打开或分享给好友



培训签到二维码

区域	项目部负责人	项目财务负责人
硬饰南区	徐勇	西南：宋昱甫 华一+华二：洪鑫浩
硬饰北区	赵辉	洪鑫浩
软饰	赵文彪	赵琨
外饰	周健	史文君

二 版本介绍及主要输出点



	市场版	上报版	主变更版*	内控版*	SOP-3版	SOP版*	SOP+3结案
目的	报价时做股份公司报备 -项目合法性	定点后做初版预算报备股份公司 -预算使用合法性	体现定点时与数据冻结之间的产品工艺主要变化 -市场调价依据	作为内部预算底稿 -项目最终盈利目标 (领导签字版)	数据冻结后发生的工程更改影响 True Up -次要更改扫尾	量产的BOM用量、生产节拍、最终销售价格、导入QAD/SAP -领导签字版	持续跟踪工厂的生产节拍与SOP版的符合性
要点	市场部上报对盈利要求不高	盈利情况应略好于市场版 净利率大于8%,不达标需要上会; 股份最低要求2%,考虑opps&risks;	覆盖所有数据冻结的变化 可以从A面冻结开始整理 组成主变更的每条明细变更需要走完工程更改审批	盈利情况得到显著改善 可以从A面冻结开始整理	完整收集主变更后的次变更项	量产应达到的节拍、用量更新	量产初期工时节拍、材料用量未能达标的改善跟踪 更新成本卡vs实际,若无法达成,走超预算申请或内部ECN
输入		从市场部获取Handover交接资料 项目经理需检查和评估;	制造策划、C-BOM变化 (常永昌工具)、销售暂估价格	和工程、AME、工厂前置识别VAVE机会和工程更改潜在机会 	小零散工程更改、销售暂作价 工厂提供材料用量数据、项目协同工程、工艺、采购复核校验更新最终成本	工厂提供节拍数据、项目协同工程、工艺、采购复核校验更新最终成本 销售最终报价	SOP签字版 当月工厂实际数据比对
输出		检查内容后调整问题项后更新	主变更后盈利变化情况的模拟	内控版财务后续跟踪母版	开发中期再更新一轮盈利情况	量产版盈利水平	当月实际盈利和改善情况

版本关注点 (5个版本)


主变更: 基于 RFQ, 更新客户 BF 后的数据, 成本与收入变化同步

内控版: 基于主变更, 对工时、耗用、模检工优化, 作为内部挑战的目标

SOP-3版: 销售更新暂估价(考虑ECN), 更新实际采购单价、投资、开发费、实测耗用及工时

SOP版: 项目经理跟踪节拍爬坡数据; 销售更新正式价; 复核最终成本

SOP+3: 耗用和工时项目与工厂时打和, 作为项目移交给工厂的最终数据, 结案汇报

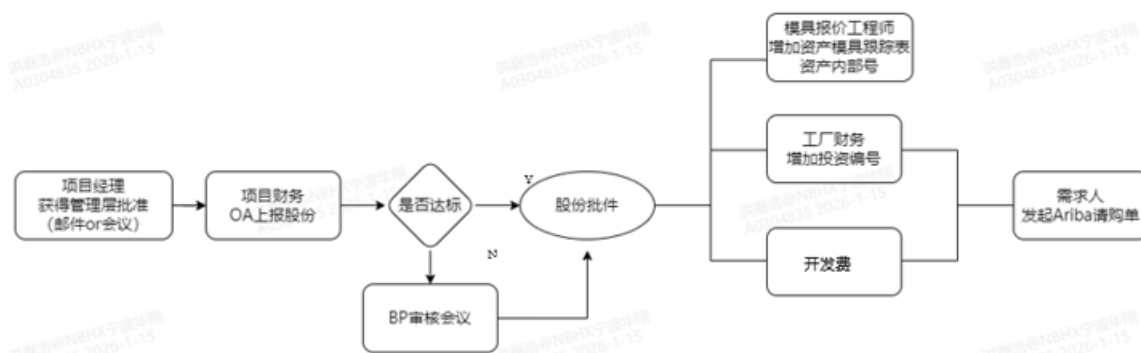

新项目 IBP 审核后，增加费用 & 资产流程：

专用资产类： IBP审批完毕，自动增加加入相应公司 FONE

通用资产类： 工厂自行申请预算，不走项目

费用类： NICE BG统一管控，新项目IBP完成，不增加费用。

如需增加，由项目总监 @ZhangFang_张放 总向 @WanLi_万黎 总申请，不由开发所属地工厂调配。如工厂需要，请要求相应项目经理联系张放总。

三 预算 - 增加项目类投资编号



FONE 中**增加项目类投资编号**，流程如下：

路径① **IBP 审批后** → 自动在 FONE 中形成投资编号

路径② **内部事项审批表增加超预算申请**（超预算）→（根据金额）项目通知宋昱甫发邮件给各家财务增加 FONE 投资编号预算

路径③ **客户ECN预算表**→（根据金额）项目通知宋昱甫发邮件给各家财务增加 FONE 投资编号预算

三 预算 - 开发费内部订单号创建流程




📅 新项目获取方式

由市场部在 OA 中发起 **SAP 项目主数据暨设计预算申请表**，在此流程中会同步建立新项目的项目号 → 自动同步至 SAP 开发费内部订单号

📅 量产后 ECN 项目获取

由 4 位项目大区经理，在有已量产项目 ECN 时，发邮件给 **@Hongxinhao_洪鑫浩**，邮件必须附带以下内容：

- ✅ a. 已审批 ECN 预算表
- ✅ b. ECN 项目号需开放时效、截止期

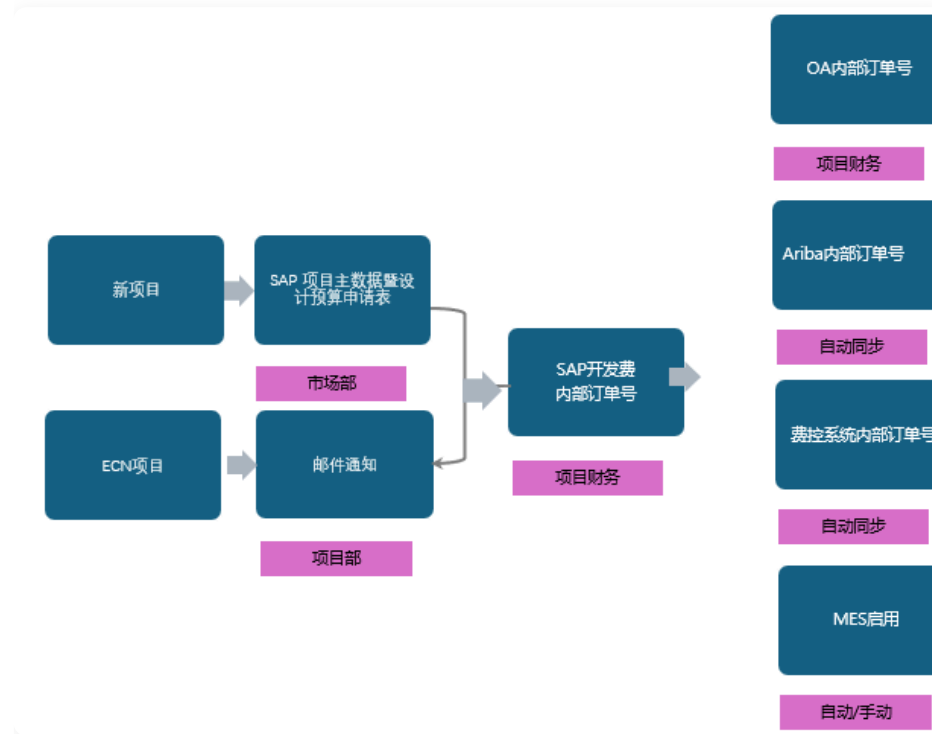

🔥 预算内外定义区分

- **项目预算内**：IBP成本卡有的投资和内部变更(修模5%)
- **项目预算外**：其余新增为项目预算外
- **年度预算(ARIBA)外**：客户变更属于年度预算外；本年新增项目年度预算外；次年使用前一年预算
是以前年度预算

🏢 集团投资会审批（不分预算内外） — 仅审批

金额区间	审批机构	时间/对接人
>500W	集团执管会	每周二·张放总（需周董批准）
100~500W	集团运营例会	每周二·张放总
<100万	事业内部审批	—

💰 NICE BG增加投资编号(财务线)

- 客户变更 <50W → ECN成本预算表
- 50~100W → ECN成本预算表 + 执管会审批
- >100W → ECN成本预算表 + 执管会审批 + 投资会会议纪要(如有) + 股份批件
- 内部变更走预留内部变更预算；工厂内部变更走工厂预算；无则打超预算
- **增加投资编号，项目经理通知以邮件形式通知财务**

🔧 NICE BG内部技术先行会议审批

<30万：上技术先行会(每周四)，由韩总批复、助理输出会议纪要并附PR完成时间、汤总批复采购执行
30~50万：上技术先行会汇报韩总后，邮件形式申请到Eric总，抄送韩总、汤总，申请批准
50~100万：上BG执管会汇报批准，通过后以会议纪要形式作为批准输出物
≥100万：按照股份公司规定，上股份公司投资审批会

FONE — 预算系统

投资编号，包含 IBP 预算和追加客户 ECN 投资预算

SAP — ERP系统

创建量产/ECN/创新/共创内部订单号

客户端以 ECN 方式走：使用结案后开启的 ECN 内部订单号

客户端以新报价方式走：同新项目创建内部订单号

OA — 办公自动化系统

新项目 SAP 创建后会同步 OA 创建内部订单号

FC — 费控系统

FC 预算即年度开发费预算，**不等于**项目开发费预算。费控预算按科目、部门、月份控制，是总包的开发费，没有项目的概念。

Ariba — 采购系统

SAP 创建内部订单号后会同步 Ariba。以 **FONE 投资编号**为投资预算；以**费控系统预算**为开发费预算

⚠ 需关注的项目

延期项目

关闭 2025年6月之前 SOP 的项目；后续逐步关闭已 SOP+3 的项目

超预算项目

关闭开发费总预算超过 100% 的项目

警告项目

开发费使用大于 75%

? 问题答疑

Q1: 已经SOP的项目，但客户陆续工程变更？

A: SOP+3关闭老项目，新建ECN项目，以ECN预算充值额度

Q2: 非项目自身原因超预算（其他项目占用、账务调整等）？

A: SOP+3找工厂财务or项目财务查看原因，打超预算申请说明原因，拿审批结果来找项目财务追加预算（仅统计层面）

Q3: 项目自身原因超预算（预算不足、产线转移等）？

A: OA超预算申请

Q4: 客户变更增加开发费预算是否考虑在预算内？

A: 已考虑

Q5: 开发费是否可以跨科目调配？

A: 原则上按科目统计，开关项目按总预算控制

四 Ariba - 投资编号、资产号、内部序号区别

① 投资编号

年度预算的编号，分以前年度、年度预算内、年度预算外。

格式：项目类 H/C 开头，工厂通用类年份开头，例如 202610XXX

② 资产号

SAP 资产号（财务建）。PR 发起时若财务未建立资产号，填写虚拟资产号，即**工厂代码**

③ 内部序号

成本卡中对资产的编号，填写在 PR 资产名称前或备注中，**财务用来和预算做匹配**

The screenshot shows the SAP Ariba PR090001: 0000 form. Annotations are as follows:

- ③: Points to the '标题' (Title) field, which contains '0000'.
- ④: Points to the '预算内' (Within Budget) dropdown menu.
- ⑤: Points to the '申请类型' (Request Type) dropdown menu, which is set to 'R1_投资类, 采购工/设备/材料'.
- ⑥: Points to the '投资编号' (Investment Number) field, which contains '202610000000'.
- ⑦: Points to the '工厂代码' (Plant Code) field, which contains '0000'.
- ⑧: Points to the '到货日期' (Delivery Date) field, which is empty.
- ⑨: Points to the '继续购物' (Continue Shopping) button.

Other visible fields include '采购单位' (Procurement Unit) set to '华翔汽车零部件有限公司', '公司代码' (Company Code) set to '2600', '申请日期' (Request Date) set to '20261000', and '使用部门' (Using Department) set to '财务部'.

📄 账户分配

A — 资产类
统一处理

F — 费用类(SAP)
需选开发费内部订单号

K — 成本中心(QAD)
选承担部门，财务入账时备注内部订单号

供应商: (无偏好) ①

国际贸易术语解释通则代码: <无值> ①

国际贸易术语解释通则地点: ①

采购组织: 1000 (井上华翔采购组织) ①

行项目文本: ①

合同: ①

物料编码: (无值) ①

物料名称: ①

大小量纲: ①

记帐 - 按行项目

帐户类型: Z90_不使用费控系统 ①

帐单接收方: * 2000 (华翔汽车内饰系统工厂) ① 13

帐户分配: * K (成本中心) ① 14

总帐科目: * (无值) ① 15

成本中心: * (无值) ① 16

拆分记帐

记帐 - 按行项目

帐户类型: Z90_不使用费控系统 ①

帐单接收方: * 2000 (华翔汽车内饰系统工厂) ①

帐户分配: * K (资产) ①

资产号: * K (资产) 固定资产 ①

F (资产)

K (成本中心)

0 (空)

发货 - 按行项目

四 成本卡相关



💰 商务信息

包含售价（不含模摊）、开发费收入、投资收入、是否分摊、分摊量，年降、快降等信息

📄 BOM

检查BOM的完整性，是否符合客户SOR、耗用量等信息

⚙️ 工艺节拍

检查工艺节拍工厂是否能落地

🔧 模检工投资

检查是否有遗漏的模检工以及专用设备，数量

🚚 物流信息

确认是否按照实际生产地更新，是否包含配送费、三方仓储费、服务费等费用

💡 开发费

检查开发费是否足够，是否包含设计、必要的差旅、试制费、试制领料等费用

	SOP -1 2026	SOP 2027	SOP +1 2028	SOP +2 2029	SOP +3 2030	SOP +4 2031	SOP +5 2032	TOTAL	%
工厂评估客户产量		12,000	28,500	27,000	24,000	19,500	9,000	120,000	
1.产品收入		9,720,000	23,085,000	21,870,000	19,440,000	15,795,000	7,290,000	97,200,000	100.0%
年降									0.0%
快降		(10,000,000)	(10,000,000)					(20,000,000)	-20.6%
产品收入		(280,000)	13,085,000	21,870,000	19,440,000	15,795,000	7,290,000	77,200,000	100.0%
. 自主采购材料成本		(5,306,896)	(12,603,878)	(11,940,516)	(10,613,792)	(8,623,706)	(3,980,172)	(53,068,960)	68.7%
. 采购快降									0.0%
采购成本		(5,306,896)	(12,603,878)	(11,940,516)	(10,613,792)	(8,623,706)	(3,980,172)	(53,068,960)	68.7%
材料占比%	0.00%	-1895.32%	96.32%	54.60%	54.60%	54.60%	54.60%		
直接人工		(971,123)	(2,306,417)	(2,185,027)	(1,942,246)	(1,578,075)	(728,342)	(9,711,230)	12.6%
直接人工占比%	0.00%	-346.83%	17.63%	9.99%	9.99%	9.99%	9.99%		
运费		(644,878)	(1,531,586)	(1,450,976)	(1,289,757)	(1,047,927)	(483,659)	(6,448,784)	8.4%
运费%	0.00%	-230.31%	11.70%	6.63%	6.63%	6.63%	6.63%		
包装		(319,308)	(758,358)	(718,444)	(638,617)	(518,876)	(239,481)	(3,193,085)	4.1%
包装%	0.00%	-114.04%	5.80%	3.29%	3.29%	3.29%	3.29%		
投产变动成本(Launch Cost)		(131,475)						(131,475)	0.2%
边际利润		(7,653,681)	(4,115,239)	5,575,037	4,955,588	4,026,415	1,858,346	4,646,466	6.0%
边际贡献 %	0.0%	-2733.5%	31.5%	-25.5%	-25.5%	-25.5%	-25.5%	6.0%	
间接人工		(531,000)	(1,261,125)	(1,194,750)	(1,062,000)	(862,875)	(398,250)	(5,310,000)	6.9%
间接人工占比%	0.00%	-189.64%	9.64%	5.46%	5.46%	5.46%	5.46%		
制造费用		(781,873)	(1,856,949)	(1,759,215)	(1,563,746)	(1,270,544)	(586,405)	(7,818,732)	10.1%
其中动力燃料费		(222,489)	(528,411)	(500,600)	(444,978)	(361,544)	(166,867)	(2,224,888)	2.9%
其中废品损失		(49,504)	(117,573)	(111,385)	(99,009)	(80,445)	(37,128)	(495,044)	0.6%
其中其他制造费用		(509,880)	(1,210,965)	(1,147,230)	(1,019,760)	(828,555)	(382,410)	(5,098,800)	6.6%
制造费用%	0.00%	-279.24%	14.19%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%		
通用设备折旧		(263,441)	(625,673)	(592,743)	(526,882)	(428,092)	(197,581)	(2,634,412)	3.4%
折旧%	0.00%	-94.09%	4.78%	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%		
试制制造费									0.0%
毛利额		(9,229,995)	(7,858,986)	2,028,329	1,802,960	1,464,905	676,110	(1,116,677)	-14.4%
毛利率%	0.0%	-3296.4%	60.1%	-9.3%	-9.3%	-9.3%	-9.3%	-14.4%	
2.模检工&专用设备									
摊销的销售	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL	%
摊销的成本		600,000	1,425,000	1,350,000	1,200,000	975,000	450,000	6,000,000	50.0%
客户付现金的销售		(178,700)	(424,413)	(402,075)	(357,400)	(290,388)	(134,025)	(1,787,000)	14.9%
客户付现金的采购成本		6,000,000						6,000,000	50.0%
客户付现金的采购成本		(11,918,270)						(11,918,270)	99.3%
工装利润		(5,496,970)	1,000,588	947,925	842,600	684,613	315,975	(1,705,270)	-14.2%
%（模检工装摊销）	0.0%	-1963.2%	-7.6%	-4.3%	-4.3%	-4.3%	-4.3%	2.2%	
3.研发费和样件费									
摊销的研发费收入	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL	%
摊销的研发费成本		70,000	166,250	157,500	140,000	113,750	52,500	700,000	50.0%
客户付现金的销售收入		210,000	210,000	280,000				700,000	50.0%
客户支付的研发成本	(2,541,729)	(3,558,420)						(6,100,149)	-435.7%
研发利润	(2,541,729)	(3,278,420)	376,250	437,500	140,000	113,750	52,500	(4,700,149)	-335.7%
%	0	-11.70864359	-0.028754299	-0.020004572	-0.007201646	-0.007201646	-0.007201646	0.060882758	

⚠ BOM修改需有 ECN / 超预算OA审批支撑 (尤其是耗用/工时增加或零件变更)

		BOM清单/定额工时					编号 No. BOM-2025-0025	
		BOM List / fixed working hours					日期Date 2025-05-27	
							页码Page	

工厂 Plant		华翔和真汽车内饰系统（上海）有限公司									
客户 Customer	T客户	车型 vehicle type	TOD	项目名称 Project Name		TOD	量产启动日期 SOP Kick-off	2025-02-18	版次 Edition	量产后	
与预算/上一版本对比 Compared with budget	预算内	附件:		变更类型 Change Type		BOM清单&BOM定额		附件:		 TOD项目BOM清单250520.xlsx(434KB)	
										 TOD项目BOM定额工时25020.xlsx(359KB)	

与预算/上一版本对比 comparison with budget/last version	序号	变更前	变更后	单位	变更描述	责任人	要求生效日期	
	1	BOM清单	上装原车型热胶胶, 本体及胶腔材料反应 热胶腔数量有所优化 上装: 0.036kg; 本体: 0.127kg; 胶腔胶: 0.027kg	上装: 0.033kg; 本体: 0.116kg; 胶腔胶: 0.024kg		根据变更后实际用量更新BOM	张义真	2025-06-01
	2	BOM清单	C TOD DP 20250218 028:本体及上装真空吸嘴罩原胶腔减少, 实际用量有效改善 前门本体: 1.065kg; 前门上装: 0.94kg; 后门本体: 0.885kg; 前门上装: 0.27kg; 后门上装: 0.33kg; 后门上装: 0.3mf	前门本体: 0.96kg; 后门本体: 0.885kg; 前门上装: 0.27kg; 后门上装: 0.33kg; 后门上装: 0.277mf		根据变更后实际用量更新BOM	张义真	2025-06-01
	3	BOM清单	EC TOD DP 20250218 028:本体及上装真空吸嘴罩原胶腔减少, 实际用量有效改善	/	/	新老物料做替换关系, 自然消耗	张义真	2025-06-01
	4	BOM清单	总成罩体号-G-升到-H	/	/	总成下胶腔拆胶腔零件-G&H做替换料关系, 自然消耗	张义真	2025-06-01
	5	BOM定额工时	季度更新, 格式更新	/	/	季度更新, 格式更新	张义真	2025-06-01
插入项								

企微问题反馈入口

小问题我们会尽快在上面回复；复杂的共性问题我们会开会讨论然后安排培训

问题反馈入口

项目问题收集

你已提交1份 | 最后提交于 02.06 14:46

*01 问题点
开发费相关(试制领料等)

*02 区域
华东二区

*03 涉及项目
CX1E

*04 问题描述
CX1E项目差旅费2026年1月金额过大

编辑收集表

生成二维码

再填一份

修改结果

如果之前填过，再填的话需要点「再填一份」

NICE_Startup

我的空间 > NICE_Startup

名称

2026投资项目预算

NICE BG_StartUp_202602

NICE BG_StartUp_202603

问题反馈入口

问题统计结果

资产模具跟踪表2026.2.24

出差申请 - 项目经理选择规则

- 跨公司支持的项目 — 出差申请选 **4大区项目经理**
- 非跨公司支持的项目 — 正常选 **本项目经理**

改动点

只需 **四位大区经理** 在HR系统做 **兼职**

原因说明

- 1 人员支援地区的**不确定性**，考虑NICE其他公司人员跨公司支援场景
- 2 项目经理、报销人员的流动性问题（人员变动频繁）
- 3 HR反复做兼职的工作量问题（避免频繁维护兼职关系）



谢谢观看

Q & A



@Hongxinhao_洪鑫浩



项目财务部
